

Réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement

Comité de pilotage du 16 mai 2008

IRSN / DEI / SESURE


IRSN / DEI / GIS

IRSN / DCOM


IRSN / DCAJ

ORDRE DU JOUR


- 1/ Approbation du CR du 8ème comité de pilotage
- 2/ Développement du système d'information RNM
 - Lot n°3 – Conception du SI
 - Lot n°4 – Tierce recette applicative
 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le développement du site web
 - Hébergement du système
- 3/ Protocole d'échange d'informations et catalogues : synthèse et démarrage de la mise en exploitation par les producteurs de données
- 4/ Information sur l'utilisation de l'outil collaboratif GFORGE pour le projet RNM
- 5/ Projet de Décision Homologuée de l'ASN abrogeant l'arrêté du 27 juin 2005
- 6/ Points divers



IRSN
INSTITUT
DE RADIOPROTECTION
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE



RÉSEAU NATIONAL
DE MESURES DE LA RADIOACTIVITÉ DE L'ENVIRONNEMENT




IRSN
INSTITUT
DE RADIOPROTECTION
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement

Développement du système d'information

F. LEPRIEUR (IRSN/DEI)

Comité de pilotage du 16 mai 2008

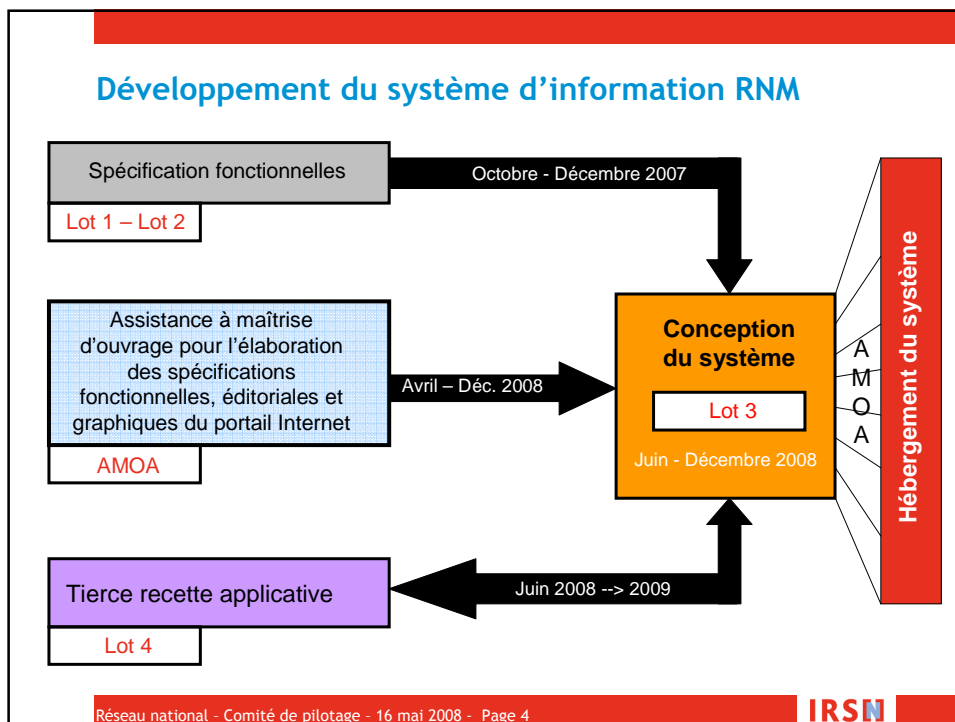

Consultation lot n° 3 - Conception du système d'information du Réseau national


29/01/2008 : Finalisation du cahier des charges pour le LOT 3

05/02/2008 : Lancement de la consultation LOT 3

24/03/2008 : Fin de la consultation LOT 3 - Début de l'examen technique et financier

10/04/2008 : Présentation orale du dossier de la société CRIL – ALYOTECH

14/04/2008 : Note interne de dépouillement du LOT 3 – Proposition de création d'une commande pour la société CRIL - ALYOTECH

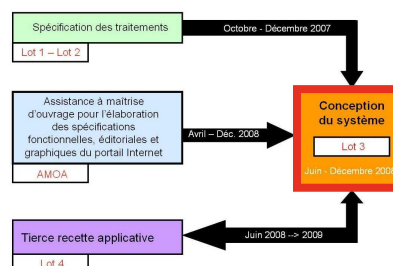

Consultation lot n° 3 - Conception du système d'information du Réseau national

➔ **Mai 2008** : passage en CCM

➔ **Juin 2008** : passation de la commande


➔ **Septembre 2008** : mise à disposition d'un système en test pour collecte des données

JALONS PREVISIONNELS RNM

Janvier 2009 : Démarrage de la collecte des données

Juin 2009 : Ouverture du site internet « accès restreint »

Janvier 2010 : Ouverture public



Consultation lot n° 4 - TRA du système d'information du Réseau national

29/01/2008 : Finalisation du cahier des charges pour le LOT 4 (tierce recette applicative)


29/02/2008 : Lancement de la consultation LOT 4

15/04/2008 : Fin de la consultation LOT 4 : Trois propositions reçues – Début de l'examen technique et financier des dossiers

13/05/2008 : Présentation orale des candidats

Fin mai 2008 : sélection de la société

Juillet 2008 : passation de la commande

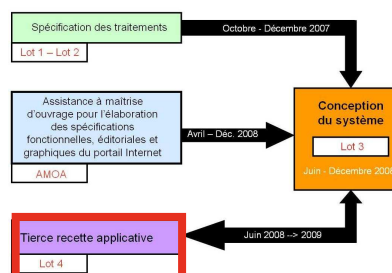

Réseau national - Comité de pilotage - 16 mai 2008 - Page 7

IRSN

Hébergement du système d'information du RNM

15/02/2008 : Publication au JOUE et au BOAMP de l'avis d'appel public à la concurrence pour l'hébergement du système d'information du RNM.

20/02/2008 : Lancement de la consultation sur la prestation de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'hébergement du SI du RNM

02/04/2008 : Réunion de lancement pour la prestation de « conseil en hébergement » avec la société SOGETI

03/04/2008 : Fin de l'AAC n°08-40775 sur l'hébergement

04/04/2008 : Dépouillement de l'AAC hébergement

14/04/2008 : Validation du rapport de dépouillement et d'analyse des candidatures pour l'hébergement du SI du RNM – 7 sociétés retenues pour l'appel d'offres restreint.

Mai 2008 : Consultation hébergement

Juin 2008 : Analyse des offres



HEBERGEMENT

Réseau national - Comité de pilotage - 16 mai 2008 - Page 8

IRSN

Consultation assistance site web RNM

12/02/2008 : Validation du CDC « Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration des spécifications fonctionnelles, éditoriales et graphiques du portail Internet


14/03/2008 : Lancement de la consultation pour l'assistance graphique et éditoriale pour la conception du site Internet du RNM

17/04/2008 : Fin de la consultation pour l'assistance graphique et éditoriale pour la conception du site Internet du RNM

15/05/2008 : Finalisation du rapport d'analyse – Choix d'un prestataire

19/05/2008 : Réunion de lancement de la prestation

04/06/2008 : Séminaire

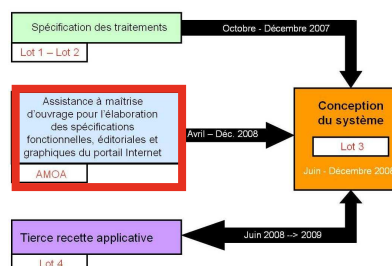

Réseau national - Comité de pilotage - 16 mai 2008 - Page 9

IRSN

IRSN
INSTITUT
DE RADIOPROTECTION
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE



Réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement

Jalons et risques identifiés

JN. MANGIN (IRSN/DEI)

Comité de pilotage du 16 mai 2008

Principaux jalons

- **Juin 2008** : passation de la commande lot 3 (conception) et lot 4 (tierce recette applicative)
- **Septembre 2008** : livraison de l'outil de collecte et de l'outil autonome de constitution des fichiers
- **Septembre 2008** : ouverture de la plateforme de test
- **Janvier 2009** : démarrage de la collecte des données
- **Avril 2009** : tests approfondis sur le site web avec des données réalistes
- **Juin 2009** : mise en ligne « privé » du site web
- **Janvier 2010** : démarrage grand public du site web

Risques identifiés

Périmètre d'identification des risques :

- Phase de développement
- Phase de démarrage
- Phase d'exploitation

Risques identifiés

■ Phase de développement :

➤ Contrainte du planning, date de démarrage collecte 01/01/2009

- Impact : Image maîtrise d'ouvrage
- Recommandation : suivi régulier intense du projet de développement, de recette et d'hébergement (juin à décembre), anticiper toute dérive.

➤ La phase de test avec plusieurs producteurs

- Impact : ne pas assurer un support efficace
- Recommandation : mettre en œuvre un échéancier précis de prise de rendez-vous

➤ La phase de test du site web

- Impact : multiplier les tests sur versions successives
- Recommandation : ne pas valider trop tôt pour disposer d'un maximum de données pertinentes en qualité et en quantité, limiter le mode itératif

Risques identifiés

■ Phase de démarrage :

➤ Référentiel incomplet

- Impact : taux d'erreurs important au démarrage
- Recommandation : connaître au plus tôt cas test de déclaration

➤ Communication sur le site web

- Impact : rejet du site RNM, image publique IRSN et ASN
- Recommandation : bien préparer plan de communication et d'approbation du site web

■ Phase d'exploitation :

➤ Maintenance du référentiel

- Impact : taux d'erreurs importants
- Recommandation : organiser la maintenance et la diffusion du référentiel

➤ Extraction des données sur système central

- Impact : performance des extractions de données
- Recommandation : spécifier précisément les extractions attendues
